비산정도측정결과보고서

2025년 3월 1일 ~ 2025년 3월 4일 (4 일간)

학교지원센터 및 법원초 석면해체 및 제거공사

(주)가나석면안전과

Tel : 031-966-2264 Fax : 0504-048-2264

본 결과서는 석면안전관리법 제21조의 규정에 의거하여 실시한 건축물석면조사 내용을 토대로 작성되었습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2021. 6. 28.>

석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	

제출인	상호(대표자)		사업자등록번호
	경기도 파주교육지원청		-
	주소		
	경기도 파주시 금정2길 55		(전화번호: 031-940-7323)
석면해체 · 제거 사업장	건물명	학교지원센터	위치 경기도 파주시 교하로1290번길 36 (다율동) 외 1개소
	연면적(㎡)	2,576.40	작업기간 2025년 3월 1일 ~ 2025년 3월 4일 (4 일간)
	석면건축자재[길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎥)]		
	526.40		*(필요시 별지 첨부)*
측정 기관	대표자	임원경	사업자등록번호 688-81-02578
	주 소	경기도 고양시 덕양구 서오릉로663번길 28	
	측정자/분석자	신시라 / 김현주, 신호철	

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
		(별지 첨부)					

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	(필요시 별지 첨부)	*(필요시 별지 첨부)*	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
	(필요시 별지 첨부)	*(필요시 별지 첨부)*	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
	(필요시 별지 첨부)	*(필요시 별지 첨부)*	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일

제출인(대표자) **경기도 파주교육지원청** (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본	수수료 없음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
신시라	대기환경산업기사	21212240532V	측정자
김현주/신호철	관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	1	부지경계선	LX50 /A1	9.8	3월 1일 9시 00분	0.001	기준미만
	2	부지경계선	LX50 /A1	9.9	3월 1일 9시 05분	0.001	기준미만
	3	부지경계선	LX50 /A1	9.9	3월 1일 9시 10분	0.001	기준미만
	4	부지경계선	LX50 /A1	9.7	3월 1일 9시 15분	0.001	기준미만
	공시료 #1, #2					0.000	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시야수
부지경계선	 측정 시작 시간 : 9시 00분	 측정 종료 시간 : 13시 10분	100
부지경계선	 측정 시작 시간 : 9시 05분	 측정 종료 시간 : 13시 15분	100
부지경계선	 측정 시작 시간 : 9시 10분	 측정 종료 시간 : 13시 20분	100
부지경계선	 측정 시작 시간 : 9시 15분	 측정 종료 시간 : 13시 25분	100

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
신시라	대기환경산업기사	21212240532V	측정자
김현주/신호철	관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
1	부지경계선	LX50 /A1	9.9	3월 2일 8시 40분	0.001	기준미만
2	부지경계선	LX50 /A1	9.9	3월 2일 8시 45분	0.001	기준미만
3	부지경계선	LX50 /A1	9.7	3월 2일 8시 50분	0.001	기준미만
4	부지경계선	LX50 /A1	9.7	3월 2일 8시 55분	0.001	기준미만
5	위생설비 입구	LX50 /A1	9.8	3월 2일 9시 00분	0.003	기준미만
6	음압기 배출구	LX50 /A1	9.9	3월 2일 9시 10분	0.002	기준미만
7	음압기 배출구	LX50 /A1	9.8	3월 2일 9시 13분	0.002	기준미만
8	음압기 배출구	LX50 /A1	9.8	3월 2일 9시 16분	0.003	기준미만
9	음압기 배출구	LX50 /A1	9.7	3월 2일 9시 20분	0.001	기준미만
10	폐기물 반출구	LX50 /A1	9.9	3월 2일 11시 00분	0.004	기준미만
11	작업장주변-실내	LX50 /A1	9.8	3월 2일 9시 30분	0.001	기준미만
12	폐기물 보관지점	LX50 /A1	9.7	3월 2일 13시 20분	0.001	기준미만
13	폐기물 보관지점	LX50 /A1	9.7	3월 2일 13시 20분	0.002	기준미만
공시료 #1, #2					0.000	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시야수
부지경계선	 측정 시작 시간 : 8시 40분	 측정 종료 시간 : 12시 50분	100
부지경계선	 측정 시작 시간 : 8시 45분	 측정 종료 시간 : 12시 55분	100
부지경계선	 측정 시작 시간 : 8시 50분	 측정 종료 시간 : 13시 00분	100
부지경계선	 측정 시작 시간 : 8시 55분	 측정 종료 시간 : 13시 05분	100
위생설비 입구	 측정 시작 시간 : 9시 00분	 측정 종료 시간 : 9시 45분	300

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시야수
음압기 배출구			300
	측정 시작 시간 : 9시 10분	측정 종료 시간 : 9시 55분	
음압기 배출구			300
	측정 시작 시간 : 9시 13분	측정 종료 시간 : 9시 58분	
음압기 배출구			300
	측정 시작 시간 : 9시 16분	측정 종료 시간 : 10시 01분	
음압기 배출구			300
	측정 시작 시간 : 9시 20분	측정 종료 시간 : 10시 05분	
폐기물 반출구			300
	측정 시작 시간 : 11시 00분	측정 종료 시간 : 11시 45분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시야수
작업장주변-실내	 측정 시작 시간 : 9시 30분	 측정 종료 시간 : 11시 40분	100
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 13시 20분	 측정 종료 시간 : 14시 05분	300
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 13시 20분	 측정 종료 시간 : 14시 05분	300

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

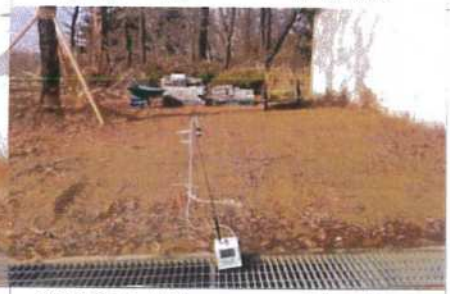
1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
신시라	대기환경산업기사	21212240532V	측정자
김현주/신호철	관련학과 졸업		분석자

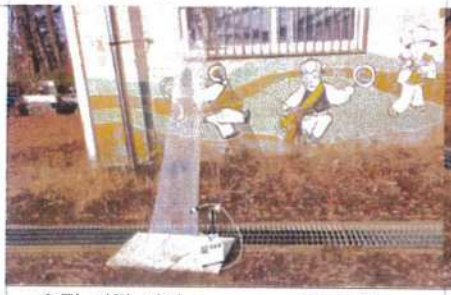
2. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
1	부지경계선	LX50 /A1	9.7	3월 3일 8시 30분	0.001	기준미만
2	부지경계선	LX50 /A1	9.8	3월 3일 8시 35분	0.001	기준미만
3	부지경계선	LX50 /A1	9.8	3월 3일 8시 40분	0.001	기준미만
4	부지경계선	LX50 /A1	9.8	3월 3일 8시 45분	0.001	기준미만
5	위생설비 입구	LX50 /A1	9.7	3월 3일 8시 50분	0.002	기준미만
6	음압기 배출구	LX50 /A1	9.9	3월 3일 8시 55분	0.003	기준미만
7	음압기 배출구	LX50 /A1	9.9	3월 3일 8시 57분	0.002	기준미만
8	폐기물 반출구	LX50 /A1	9.8	3월 3일 10시 30분	0.004	기준미만
9	위생설비 입구	LX50 /A1	9.8	3월 3일 9시 10분	0.003	기준미만
10	음압기 배출구	LX50 /A1	9.9	3월 3일 9시 13분	0.002	기준미만
11	음압기 배출구	LX50 /A1	9.7	3월 3일 9시 15분	0.001	기준미만
12	폐기물 반출구	LX50 /A1	9.7	3월 3일 10시 40분	0.004	기준미만
13	폐기물 보관지점	LX50 /A1	9.8	3월 3일 12시 00분	0.001	기준미만
14	폐기물 보관지점	LX40 /A1	9.7	3월 3일 12시 00분	0.001	기준미만
15	폐기물 보관지점	LX40 /A1	9.8	3월 3일 12시 05분	0.003	기준미만
16	폐기물 보관지점	LX40 /A1	9.8	3월 3일 12시 05분	0.002	기준미만
공시료 #1, #2					0.000	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시야수
부지경계선	 측정 시작 시간 : 8시 30분	 측정 종료 시간 : 12시 40분	100
부지경계선	 측정 시작 시간 : 8시 35분	 측정 종료 시간 : 12시 45분	100
부지경계선	 측정 시작 시간 : 8시 40분	 측정 종료 시간 : 12시 50분	100
부지경계선	 측정 시작 시간 : 8시 45분	 측정 종료 시간 : 12시 55분	100
위생설비 입구	 측정 시작 시간 : 8시 50분	 측정 종료 시간 : 9시 35분	300

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시야수
음압기 배출구	 측정 시작 시간 : 8시 55분	 측정 종료 시간 : 9시 40분	300
음압기 배출구	 측정 시작 시간 : 8시 57분	 측정 종료 시간 : 9시 42분	300
폐기물 반출구	 측정 시작 시간 : 10시 30분	 측정 종료 시간 : 11시 15분	300
위생설비 입구	 측정 시작 시간 : 9시 10분	 측정 종료 시간 : 9시 55분	300
음압기 배출구	 측정 시작 시간 : 9시 13분	 측정 종료 시간 : 9시 58분	300

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시야수
음압기 배출구	 측정 시작 시간 : 9시 15분	 측정 종료 시간 : 10시 00분	300
폐기물 반출구	 측정 시작 시간 : 10시 40분	 측정 종료 시간 : 11시 25분	300
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 12시 00분	 측정 종료 시간 : 12시 45분	300
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 12시 00분	 측정 종료 시간 : 12시 45분	300
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 12시 05분	 측정 종료 시간 : 12시 50분	300

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시야수
폐기물 보관지점			300
	측정 시작 시간 : 12시 05분	측정 종료 시간 : 12시 50분	

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
신시라	대기환경산업기사	21212240532V	측정자
김현주/신호철	관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
1	폐기물 보관지점	LX50 /A1	9.9	3월 4일 7시 30분	0.001	기준미만
2	폐기물 보관지점	LX50 /A1	9.9	3월 4일 7시 30분	0.001	기준미만
3	폐기물 보관지점	LX50 /A1	9.8	3월 4일 7시 35분	0.001	기준미만
4	폐기물 보관지점	LX50 /A1	9.8	3월 4일 7시 35분	0.001	기준미만

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	시야수
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 7시 30분	 측정 종료 시간 : 8시 15분	300
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 7시 30분	 측정 종료 시간 : 8시 15분	300
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 7시 35분	 측정 종료 시간 : 8시 20분	300
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간 : 7시 35분	 측정 종료 시간 : 8시 20분	300

4. 지정서

제2023-120013호

석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	[redacted]	
소 재 지	[redacted]	
대표자성명	임원경	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	[redacted]
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	[redacted]
	대행(지정) 지역	

※ [redacted]

[redacted]

※ [redacted]

[redacted]

2023. 6. 13.

중부지방고용노동청장
